




IN SAMENWERKING MET:

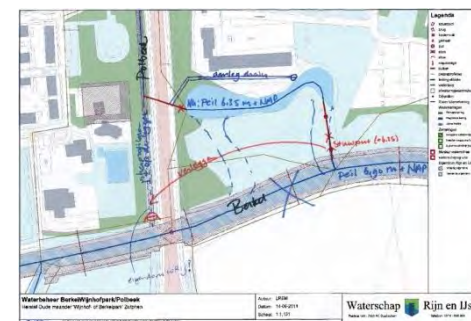

De bewoners van de wijk Noordveen

≡ provincie
Gelderland



Infrastructuur · Water · Milieu · Gebouwen

BETROKKEN PARTIJEN

- Opdrachtgevers:



- Mede tot stand gekomen door:



- Aannemer:



- Ontwerp:

De bewoners
van de wijk
Noordveen

i.s.m.



INHOUD

- **FASERING**
- **PLANNING**
- **BEPERKEN OVERLAST**
- **UITVOERING**
- **VERWIJDEREN AC LEIDING**
- **STARTHANDELING**
- **VRAGEN**

FASERING

- **Start werk (2 oktober 2013 na starthandeling)**
 - Kappen bomen
 - Onderzoek archeologie en OCE
 - Verwijderen AC leiding + vullen oude leiding
 - Ontgraven meanders
 - Uitvlakken terrein oude slib depot
 - Heien van palen t.b.v. voetgangersbrug
 - Omleggen electra kabel
 - Aanbrengen brug en steiger
 - Aansluiten nieuw Berkel-tracé
 - Inrichting park en aanbrengen groenvoorzieningen

- **Oplevering eind 2013**

The landscape plan shows a park area with a winding path (orange line) and a river (blue line). Key features include:

- Wijnhofstraat** at the top.
- Den Elvenweg** on the left.
- voetgangersbrug** (pedestrian bridge) crossing the river.
- Dempen oude t** (Dampening old t) near the bridge.
- Verwijderen AC leiding** (Remove AC line) with an arrow pointing to a dashed line.
- Omleggen el** (Move el) with an arrow pointing to a dashed line.
- Handenkollegeroep** (Hand collection call).
- graspad, obstakelvrije ruimte 4 meter** (Grass path, obstacle-free space 4 meters).
- bruglaan, bestaande brug** (Bridge lane, existing bridge).
- houteenboom** (Wooden tree).
- interactieve, lokale natuurspeelplek** (Interactive, local natural play area).
- hoogte** (Height).
- nieuwe houten bank** (New wooden bench).
- bestaande in talud** (Existing in talus).
- duidelijk** (Clear).
- ruimteovername, kleine visuele door deuren** (Space takeover, small visual doors).
- voetpad (nieuwe steden)** (Footpath (new city)).
- voetpad halfverharding (breedte 1,20 m.)** (Footpath half-paved (width 1.20 m.)).
- ten tegen wild waar minder** (Against wild where less).
- 1** and **4** are marked on the plan.

PLANNING

week:	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1 t/m 26
	2013															2014
Voorbereiding																
Verwijderen beplanting																
Onderzoek archeologie / OCE																
Grondwerk																
Werkzaamheden AC leiding																
Werkzaamheden electra kabel																
Inrichtingswerken																
wandelpaden																
Beplanting																
Oplevering																
Onderhoudsperiode																

BEPERKEN OVERLAST

- Geluidsoverlast
- Trillingen
- Afsluiting park
- Bereikbaarheid

BEPERKEN OVERLAST

- Geluidsoverlast

- Bouwen betekend geluidsoverlast
- De aannemer werkt uitsluitend met materieel dat niet meer geluid produceert dan 50 dB (vergelijkbaar met een afzuigkap), gemeten uit de dichtstbijzijnde bebouwing
- Daarbij beperken wij ons tot de werktijden tussen 07:00 en 17:00 uur met een enkele uitzondering tot 19:00 uur

BEPERKEN OVERLAST

- Trillingen

- Overlast door trillingen zal vrijwel niet plaats vinden
- Er dienen enkel 4 betonnen palen te worden geheid t.b.v. het landhoofd van de voetgangersbrug, de overlast hiervan zal minimaal zijn

BEPERKEN OVERLAST

- Afsluiting park

- Gedurende de gehele werkzaamheden is het park afgesloten met bouwhekken. Dit gebeurt om de veiligheid van werknemers en bewoners te garanderen
- Voor het uitlaten van uw huisdieren wordt er een klein deel van het park vrijgegeven (zie locatie op volgende afbeelding)
- Deze tijdelijke uitlaatzone blijft goed bereikbaar
- Er worden 2 zichtplekken gerealiseerd waar het werk gevolgd kan worden

- Herinrichting Wijnhofpark -

BEPERKEN OVERLAST

- Locatie zichtpunten en tijdelijke uitlaatzone -



BEPERKEN OVERLAST

- Bereikbaarheid

- De in- en uitrit t.b.v. het voormalige slibdepot wordt gebruikt als inrit voor het bouwverkeer
- Dit betekent weinig overlast in de wijk

UITVOERING

- Om de voortgang van het werk te kunnen volgen treft Gerwers de volgende maatregelen:
 - Er worden 2 zichtpunten ingericht
 - Elke vrijdagochtend tussen 10:00 en 11:00 een inloopsprekkuur in de schaftkeet
 - Dhr. P. Gerwers is de uitvoerder en het aanspreekpunt tijdens de werkzaamheden op dit project. Hij is bereikbaar op:
06 – 53395545
 - Vanuit de gemeente Zutphen is wijkregisseur Dhr. K. Meijer het aanspreekpunt. Hij is bereikbaar op:
06 - 22226027


VERWIJDEREN AC-LEIDING

- **Het verwijderen van de asbestcementleiding gebeurt in 2 fases:**
 - Fase 1 - Oostelijk deel (2 weken)
 - Fase 2 - N348 (3 weken)


- **Voor de werkzaamheden in fase 2 zijn de volgende voorzieningen nodig:**
 - Opstelplaats t.b.v. een telekraan
 - Creëren van een bouwkuip
 - Verwijderen van struikgewas

VERWIJDEREN AC-LEIDING

- Overzichtstekening

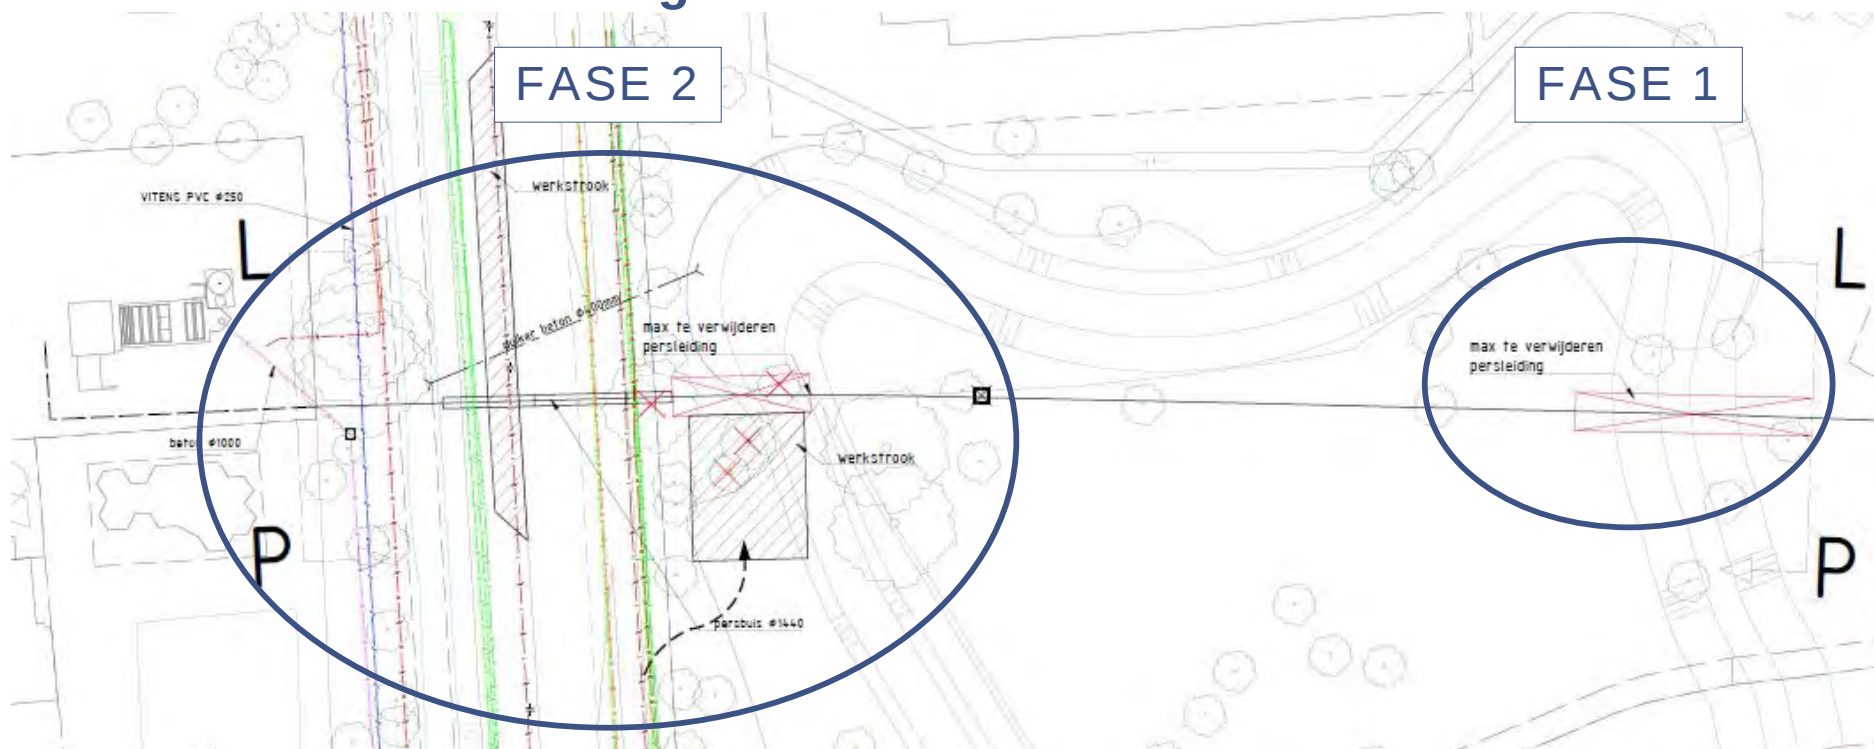

VERWIJDEREN AC-LEIDING

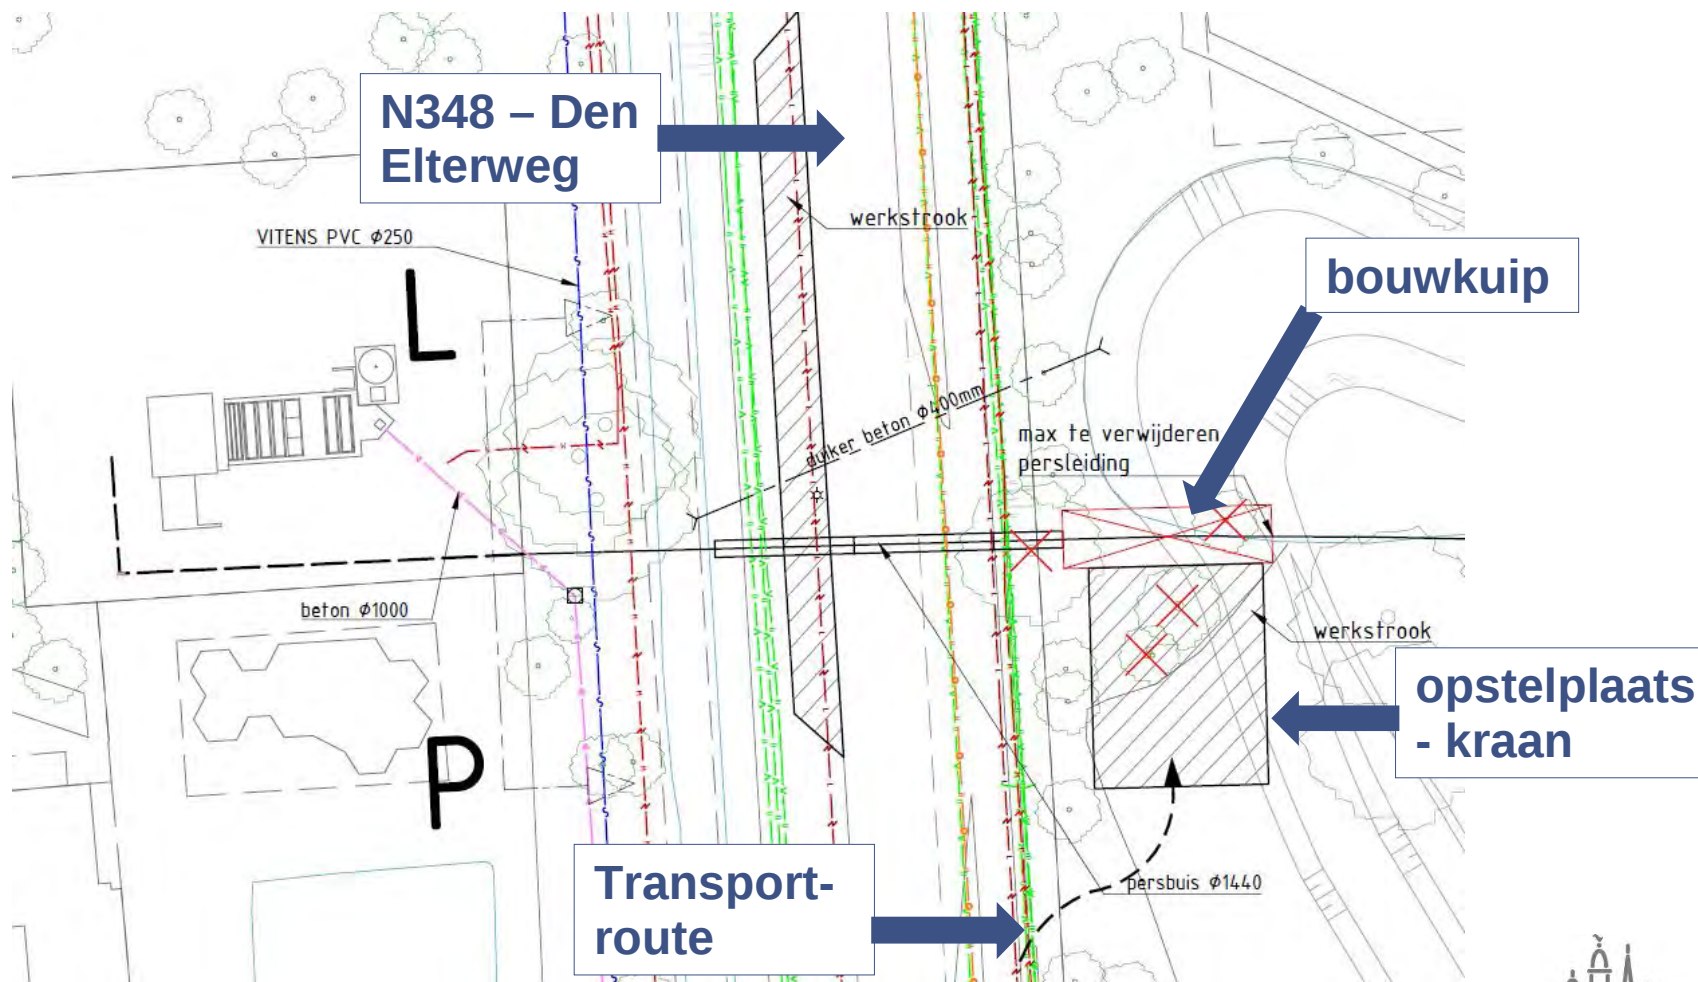

STARTHANDELING, KOMT U OOK?

- **Woensdag 2 oktober 2013, 09:30, t.h.v. “het rode bankje”**

Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn

Na deze symbolische starthandeling zal de aannemer starten met de werkzaamheden

VRAGEN

De volgende personen zijn in deze ruimte aanwezig voor het beantwoorden van uw vragen:

-Waterschap Rijn en IJssel

- Jaco van Langen
- Joost van der Meer

-Gemeente Zutphen

- Anton Kok
- Kees Meijer
- Rob Rikkerink

-Aannemersbedrijf Gerwers Tilligte B.V. (aannemer inrichting Wijnhofpark)

- Peter Gerwers
- Mark Hoekstra

-Aannemer GMB (aannemer verwijderen AC leiding)

- Paul Rooswinkel
